
Empreitada para Construção do Cais Fluvial de Castanheira do Ribatejo

MOTA-ENGIL ENGENHARIA

ID	WBS	Nome da Tarefa	Duration	Start	Finish
1	1	**CAIS FLUVIAL DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO**	**326 days**	**Fri 06/06/25**	**Fri 04/09/26**
2	**1.1**	**CONTRATO**	**0 days**	**Fri 06/06/25**	**Fri 06/06/25**
3	**1.2**	**CONSIGNAÇÃO**	**0 days**	**Thu 31/07/25**	**Thu 31/07/25**
4	**1.3**	**Datas Chave**	**286 days**	**Fri 01/08/25**	**Fri 04/09/26**
5	1.3.1	Submissão do DPSS	0 days	Fri 01/08/25	Fri 01/08/25
6	1.3.2	Submissão do PAAO	0 days	Fri 08/08/25	Fri 08/08/25
7	1.3.3	Início do Prazo Contractual	0 days	Fri 05/09/25	Fri 05/09/25
8	1.3.4	Duração Contractual Empreitada - 12 meses	261 days	Fri 05/09/25	Fri 04/09/26
9	1.3.5	Conclusão da Empreitada	0 days	Fri 04/09/26	Fri 04/09/26
10	**1.3.6**	**Acompanhamento Arqueológico - Cronograma inicial**	**40 days**	**Fri 01/08/25**	**Thu 25/09/25**
11	1.3.6.1	Submissão do PATA (Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológico	0 days	Fri 01/08/25	Fri 01/08/25
12	1.3.6.2	Aprovação do PATA	0 days	Thu 21/08/25	Thu 21/08/25
13	1.3.6.3	Fase Prévia + Submissão do Relatório	2 wks	Fri 22/08/25	Thu 04/09/25
14	1.3.6.4	Aprovação do Relatório Fase Prévia	3 wks	Fri 05/09/25	Thu 25/09/25
15	**1.4**	**Variante S3_R2**	**271 days**	**Fri 22/08/25**	**Fri 04/09/26**
16	1.4.1	Montagem do Estaleiro Inicial	2 days	Fri 22/08/25	Mon 25/08/25
17	1.4.2	Terraplanagem e Vedações	11 days	Fri 05/09/25	Fri 19/09/25
18	1.4.3	Execução da Plataforma Trabalhos Geodrenos	11 days	Mon 22/09/25	Mon 06/10/25
19	1.4.4	Mobilização e Execução dos Geodrenos	44 days	Tue 07/10/25	Fri 05/12/25
20	1.4.5	Instalação de Inclinómetros	23 days	Wed 05/11/25	Fri 05/12/25
21	1.4.6	Colocação de Aterro de Pré-carga	23 days	Wed 19/11/25	Fri 19/12/25
22	1.4.7	Período de Espera (4 meses)	86 days	Mon 22/12/25	Mon 20/04/26
23	1.4.8	Montagem do Estaleiro	20 days	Mon 09/03/26	Fri 03/04/26
24	1.4.9	Remoção do Aterro de Pré-carga	12 days	Tue 21/04/26	Wed 06/05/26
25	1.4.10	Drenagem de Águas Pluviais	43 days	Thu 07/05/26	Mon 06/07/26
26	1.4.11	Pavimentação e sinalização	44 days	Fri 05/06/26	Wed 05/08/26
27	1.4.12	Drenagem águas residuais	43 days	Thu 07/05/26	Mon 06/07/26
28	1.4.13	Rede de Aguas e Incêndios	44 days	Fri 05/06/26	Wed 05/08/26
29	1.4.14	Integração paisagistica	45 days	Mon 06/07/26	Fri 04/09/26
30	1.4.15	Instalações eléctricas	54 days	Fri 05/06/26	Wed 19/08/26
31	1.4.16	Ponte Cais - Terra	45 days	Mon 06/04/26	Fri 05/06/26
32	1.4.17	Ponte Cais - Rio	43 days	Mon 08/06/26	Wed 05/08/26
33	1.4.18	Dq Alba	35 days	Mon 20/07/26	Fri 04/09/26
34	1.4.19	Maciços de Amarração	23 days	Wed 20/05/26	Fri 19/06/26
35	1.4.20	Edificações	43 days	Thu 07/05/26	Mon 06/07/26
36	1.4.21	Diversos	65 days	Thu 07/05/26	Wed 05/08/26

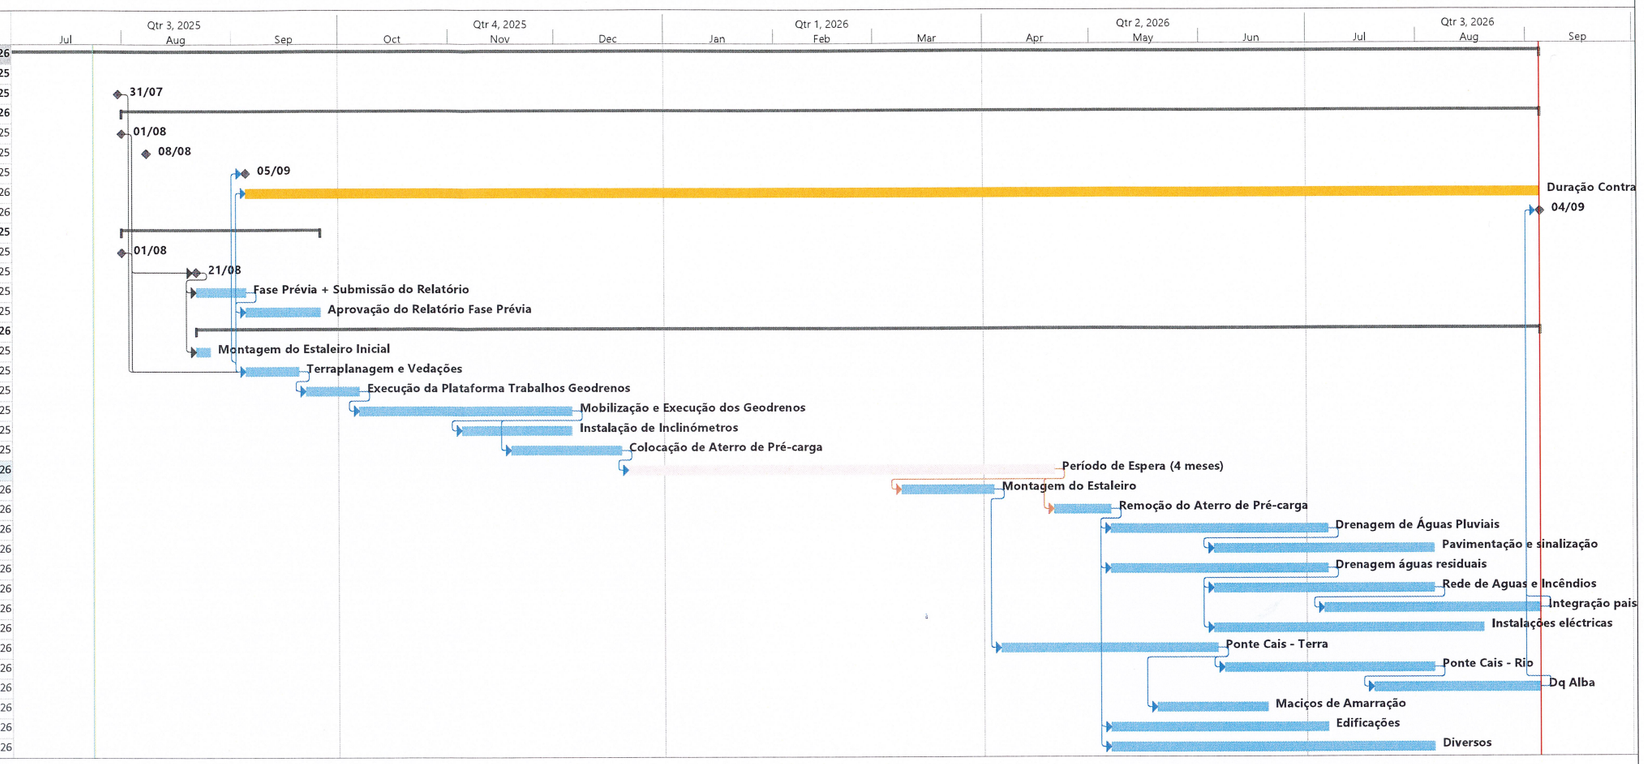

Data: Thu 24/07/25

Tarefa	Sumário	Marco Inativo	Apenas-duração	Apenas início	Marco Externo	Progresso Manual			
Dividir	Resumo de Projeto	Resumo Inativo	Resumo da Agregação Manual	Apenas-conclusão	Prazo				
Marco	Tarefa Inativa	Tarefa Manual	Resumo Manual	Tarefas Externas	Progresso				
